| Visa | |
|---|---|
| Rédacteur | B. LEMETAYER |

# Accessibilité RTE

# Synthèse Nationale des Evénements du vendredi 18 mars 2022

## Faits marquants de la journée écoulée et contraintes attendues pour la journée en cours

La journée écoulée a été marquée par la présence de manifestants devant le poste 225 kV de PRINQUIAU, (poste d'évacuation du parc Offshore de Banc de Guérande) ayant nécessité sa prise en local et la précarisation de la zone de Pontchateau, et ayant entraîné des dégradations.
**Cet évènement a fait l'objet d'un MIN du GMR Atlantique**.

Contraintes attendues pour la journée en cours :

Des échanges importants sont prévus avec l'Espagne à partir de 14h30 et pendant tout le creux de l'après-midi, ce qui pourrait entraîner quelques contraintes aux frontières entre les zones des CE Toulouse et Nantes et nécessiter :

- des prises de schéma aux postes 225 kV de BREUIL et SAINT-CHRISTOL, ainsi qu'au poste 400 kV d'EGUZON,
- une contribution des autres CE pour la maîtrise des tensions.

## Gestion de l'Equilibre Offre Demande

| Jour | jeudi 17 mars 2022 | *Journée en cours* |
|---|---|---|
| Pointe de consommation | 64 900 MW | *64 800 MW* |
| Marge 15' à la pointe | 5 293 MW | *1 507 MW* |
| EJP | Non | *Non* |
| TEMPO | Bleu | *Bleu* |

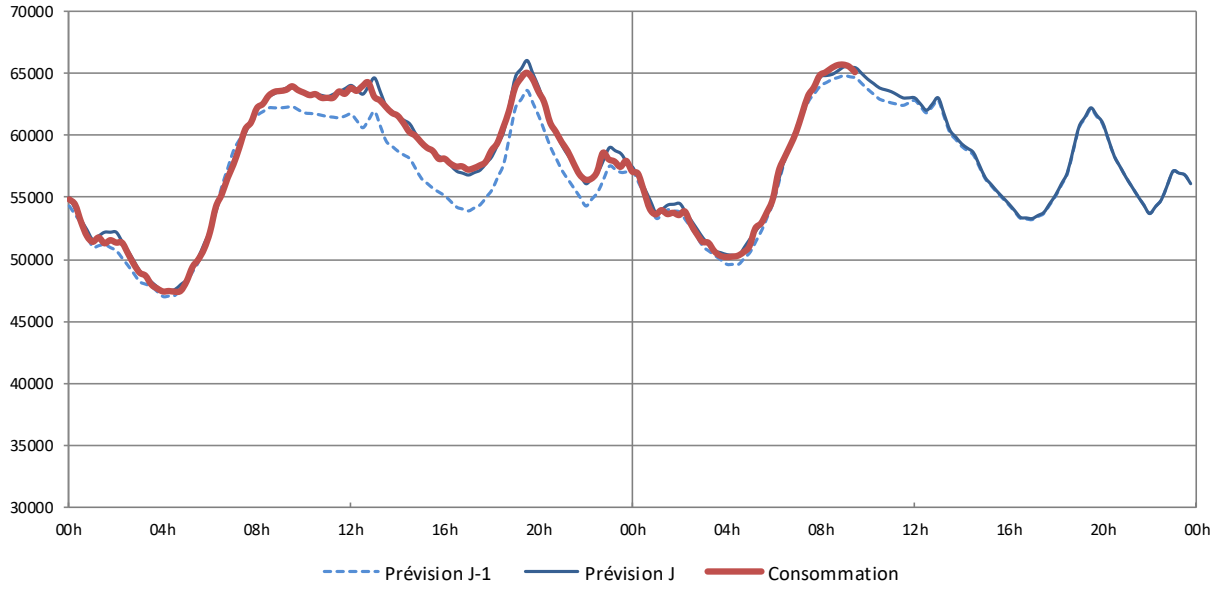


Lien : https://www.rte-france.com/eco2mix/la-consommation-delectricite-en-france

- **Ecart(s) entre la prévision J-1 et la réalisation de consommation**

| Date | Impact(s) |
|---|---|
| 17/03/22 | Des écarts supérieurs à 2 000 MW entre la prévision J-1 et la réalisation de consommation ont été observés entre 11h30 et 23h00 (prévision J-1 inférieure à la réalisation), avec plusieurs points au-delà de 3 000 MW, en raison :<br>• d'une nébulosité plus importante que prévue (7 octa au lieu de 4),<br>• d'une température allant jusqu'à moins deux degrés par rapport aux prévisions J-1,<br>• De la prolongation du phénomène de sable du Sahara. |

- **Ecart(s) de Fréquence**

| Date et heure | Impact(s) et Action(s) réalisée(s) | RTE Contributeur |
|---|---|---|
| 17/03/22 à 21h00 | Un écart de fréquence à la baisse de 100 mHz a été observé pendant 1 minute et 30 secondes : écart maximal de -120.4 mHz.<br>RTE est contributeur avec un écart de réglage maximal de -923MW (dont -270 MW de correction IGCC), soit à hauteur d'environ 26%. | OUI |

- **Déclenchement(s) et/ou écart(s) des groupes de production et de leur contribution aux Services Système (SSY)**

- **Listing des actions réalisées (envoi d'ordre SAS, mode dégradé, demande de couplage...)**

| Date et heure | Centre | Action(s) réalisée(s) |
|---|---|---|
| 17/03/22 à 15h45 | CNES | Envoi d'un mode dégradé sur le mécanisme d'ajustement pour insuffisance de marge sur la pointe du soir (18h00 - 20h00), en raison d'un sous bouclage et d'aléas sur la consommation. |

## Gestion des interconnexions et du Mécanisme d'Ajustement

- **Bilan des échanges commerciaux**

Journée écoulée : Les échanges commerciaux ont été importateurs (entre -705 MW et -6 304 MW)

Journée en cours : Les échanges commerciaux sont vus exportateurs jusqu'à 8 172 MW, et importateurs jusqu'à - 4 005 MW

Programme des échanges commerciaux à la pointe de consommation de la journée en cours (à 09h00) :

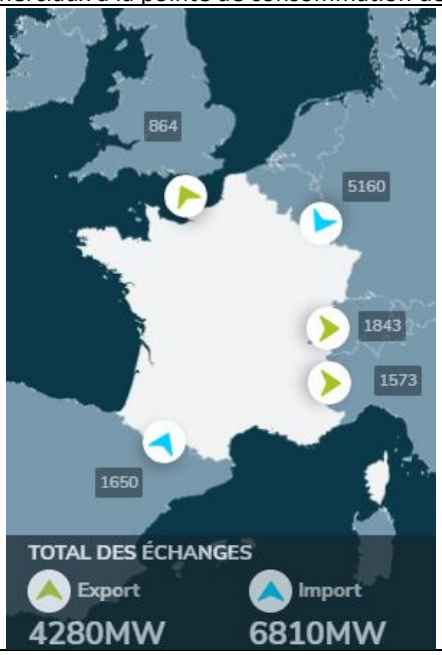


Nota : Pour plus de détails sur les programmes d'échanges par frontière, veuillez consulter le lien suivant : https://www.rte-france.com/eco2mix/les-echanges-commerciaux-aux-frontieres

- **Evénement(s) significatif(s) affectant le marché de l'électricité**

- **Evénement(s) impactant la gestion des interconnexions**

| Date et heure | Frontière | Impact(s) et action(s) réalisée(s) |
|---|---|---|
| 17/03/22 | Espagne | Mise en œuvre d'une procédure de countertrading pour un volume maximal de 613 MW sur la plage 00h00 – 06h00, pour réduire les imports à la demande de RTE pour le transit en N sur la liaison 400 kV ARGIA – HERNANI.<br>Mise en œuvre d'une procédure de countertrading programmée pour un volume maximal de 50 MW sur les plages 17h00 – 20h00 et 23h00 – 24h00, pour réduire les imports à la demande de CORESO (recalcul de la capacité d'échange infrajournalière). |
| 18/03/22 | Espagne | Mise en œuvre d'une procédure de countertrading programmée pour un volume maximal de 550 MW sur la plage 00h00 – 07h00, pour réduire les imports à la demande de CORESO (recalcul de la capacité d'échange infrajournalière). |

- **Ailleurs en Europe**

## Evénement(s) ayant fait l'objet d'un MIN

**<u>MIN du GMR Atlantique du jeudi 17/03/2022 à 10h42 – indice 2 (clôture)</u> :**

**<u>Synthèse</u> :**

**Entité** : GMR Atlantique

**Groupement ou service** : groupement de Cordemais

**Région administrative** : Pays de la Loire

**Département ou commune** : Loire Atlantique, commune de Prinquiau

**Ouvrages impliqués** : poste 225 kV de PRINQUIAU

**Localisation géographique** :

**Faits** :

- 10h42 : Prise en local du poste 225 kV de PRINQUIAU (poste d'évacuation du parc Offshore de Banc de Guérande). Ouverture du départ 225 kV PONTCHATEAU au poste de PRINQUIAU. Le poste 225 kV de PONTCHATEAU se trouve en antenne derrière CORDEMAIS – PONTCHATEAU 225 kV (BEZON – PONTCHATEAU 225 kV est consignée et en retrait). Des manifestants sont présents devant le poste 225 kV de PRINQUIAU.
- 11h10 : Mise en poche de la zone de PONTCHATEAU pour respecter les critères matériels en N-1 (poche de 180 MW environ).
- 11h32 : les manifestants ont quitté les lieux.
- 12h15 : information qu'un câble basse tension et de fibres optiques sont détériorés au poste 225 kV de PRINQUIAU sur le départ PONTCHATEAU. La mise en service de ce départ ne sera donc pas immédiate.
- 13h15 : Demande de déconsignation de BEZON – PONTCHATEAU 225 kV
- 13h25 : Prise du poste de PONTCHATEAU en local. Des manifestants sont dans le poste.
- 14h30 : Un salarié du GMR atlantique a pu rentrer dans le poste de PONTCHATEAU. Il fait un état des lieux des installations et déconsigne le départ BEZON 225 kV. D'autres dégradations sont constatées au poste 225 kV de PRINQUIAU, notamment sur des densistats de pôles SF6. Les réparations sont en cours.
- 15h35 : la liaison 225 kV BEZON – PONTCHATEAU est en service. L'alimentation 225 kV est sécurisée.

**Conséquences directes** : précarisation de la zone de Pontchateau

## Evénement(s) réseaux

- **Evénement(s) sur le réseau électrique avec impact clientèle (Coupure Longue)**

- **Retraits Impératifs Immédiats, Manœuvres d'Urgence, Retraits Urgents et/ou autre(s) défauts permanents conduisant à la perte définitive d'ouvrages 400 kV**

- **Autre(s) indisponibilité(s) non programmée(s) sur le réseau 400 kV (ou 225 kV proche)**

| Date et heure | Centre | Ouvrage(s) concerné(s) et impact(s) |
|---|---|---|
| 17/03/22 | Nantes | **Poste 225 kV de Prinquiau**<br>Prise en local du poste lors d'un mouvement social.<br>Informations de câble BT détériorés dans le poste. La protection différentielle de barre 225 kV remonte HS ainsi qu'un défaut téléprotection sur la liaison 225 kV CORDEMAIS – PRINQUIAUX n°2.<br>Mise hors service des réenclencheurs automatiques Mono et Tri aux encadrants (PSEM) et demande d'une étude de Stabilité : risque de perte des groupes de Grande-Rivière et Ponant sur défaut barre.<br>A l'issue de l'intervention du GMR, l'ensemble des protections est revenu à un fonctionnement nominal, sauf pour la liaison 225 kV PRINQUIAU – PONTCHATEAU qui est retirée de la conduite.<br>**Voir MIN par ailleurs.** |

- **Evénement(s) sur le réseau de télécommunication et de téléconduite (TCM-TCD)**

- **Traitement des congestions**

- **Contrainte de gestion de la tension**

- **Contrainte de gestion des transits**

- **Dysfonctionnement(s) des outils de conduite et d'étude et écarts sur la qualité des Points Figés**

| Date et heure | Outil | Impact(s) et action(s) réalisée(s) |
|---|---|---|
| 17/03/22 à 09h00 | DCC | L'automate DCC (envoi des ordres d'interruptibilité) est basculé sur le serveur secours, le serveur principal étant hors service. |
| 17/03/22 à 10h59 | Convergence | Valeur de production EnR HTA incohérente (9334 MW au lieu de 1222 MW), impactant les bilans SNC France. La consommation de la zone du CE Lille est passée de 6 764 MW à 14 944 MW.<br>Action curative : masquage de la production EnR sur le SRC.<br>L'anomalie vient des données de production sur le poste d'ALLEUX où celle-ci a été supérieure à 8000MW. Il n'y a pas eu de contrôle de validité de TM réalisée par IPES N.<br>Un correctif a été installé dans l'après-midi du 17/03/22. Le bug est corrigé à 16h23. |
| 17/03/22 à 19h00 | SEA | L'application est de nouveau disponible suite à l'intervention débutée mercredi 16/03/22 sur l'infrastructure CALIN. |
| 17/03/22 | Convergence | **Lille :** Taux de 3,30% de points figés à corriger en raison du masquage de l'anneau de garde Paris<br>**Nancy :** Taux de 0,40% de points figés à corriger |

## Evénement(s) à enjeux

- **Evénement(s) à enjeu « Prévention et Santé au Travail »**

- **Evénement(s) à enjeux « Relations tiers »**

| Date et heure | Centre | Description |
|---|---|---|
| 11/03/22 à 11h13 | Toulouse | **Lieu : liaison 63 kV BIEVRES – SACLAY (hors exploitation)**<br>Description : Constat de l'agression d'un câble au niveau de la portée 25-26. Le câble a dû être accroché par un camion et accroché dans un arbre.<br>Le 16/03/2022, remise en place du câble suite à l'intervention de l'équipe Ligne. |
| 16/03/22 à 16h00 | Toulouse | **Lieu : poste de PASSAGE D'AGEN (ENEDIS)**<br>Description : dans le cadre de travaux ENEDIS, le prestataire démolit un bâtiment RTE comme prévu. Mais le mur et la toiture de celui-ci se sont affaissés entraînant une situation dangereuse et un risque important sur les installations électriques RTE voisines.<br>Le jour-même, un point d'arrêt du chantier est réalisé.<br>Le 17/03/22, une rencontre entre ENEDIS, le prestataire et RTE est organisée afin de définir et adopter les mesures nécessaires pour terminer le chantier en toute sécurité. |

- **Evénement(s) à enjeux « Environnement »**

- **Evénement(s) à enjeux « Confidentialité »**

- **Evénement(s) à enjeux « Sécurité et protection du patrimoine »**

## Liens utiles pour en savoir plus :

| | |
|---|---|
| Indisponibilités du réseau 400 kV | https://www.services-rte.com/fr/visualisez-les-donnees-publiees-par-rte/indisponibilites-du-reseau-de-transport-impact-ntc.html |
| Données techniques du CNES | http://dotc.rte-france.com/ |
| Tableau de bord des données | https://www.services-rte.com/fr/visualisez-les-donnees-publiees-par-rte.html |
| Lien vers éCO2mix | http://www.rte-et-vous.com/fr/eco2mix/eco2mix |
